PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-5

Fase 3 · Analisis Kebutuhan (SRS)

Kelompok · Kelas

Kelompok 6 · 4KA22

Proyek · Klien

KOL Management Website
PT. Siapamau Infinite Growth

Pelapor · Tanggal

Satria Ananda (SA) [25/10/2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

30%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

27%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: M6 SRS Proses · sebelum Minggu 7 · [aman]

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
2.1	Identifikasi pengguna (KOL, Admin/Tim Brand)	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag. 1.1 dan 1.2
2.2	Observasi alur kerja founder dan admin	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag. 2.1, 2.2, dan 2.3
2.3	Perancangan Usecase dan user story	Satria Ananda	Mg 6	Revisi	SRS bag. 4.1, gambar 3.1 dan 4.1
2.4	Analisis Kebutuhan Fungsional	Satria Ananda	Mg 6	Revisi	SRS bag. 4.2, 4.3, dan 4.4
2.5	Analisis Kebutuhan non Fungsional	Satria Ananda	Mg 6	Revisi	SRS bag. 5

Selesai 3 dari 6 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- SRS KOL Management Website v1.0 – draf – [tautan vclass] vclass]
- Diagram konteks dan use case (Gbr. 3.1, 4.1)
- 15 KF · 8 KNF · 8 use case · 12 user story
- Matriks keterlacakan kebutuhan (bag. 9)

Bukti: nomor bagian dan gambar pada SRS. Lampiran A (notulen, kuesioner) kuesioner) dan Lampiran B (persetujuan klien) masih dilengkapi.

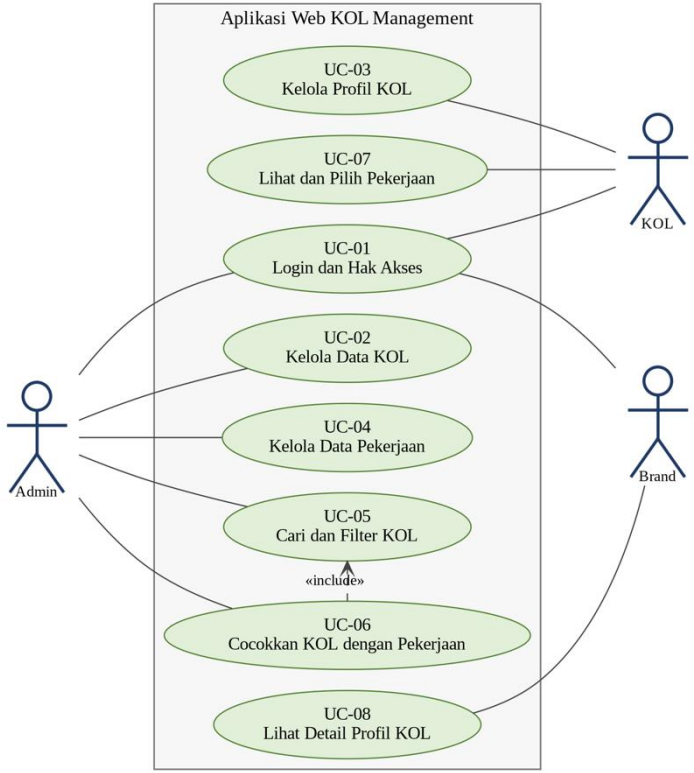

Gambar 4.1 Diagram Use Case (SRS bag. 4.2)

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Melvin Diandra S.A	Project Manager	Koordinasi penyusunan SRS v1.0 dan Riwayat Revisi	[__]
Satria Ananda H.S	System Analyst	SRS bag. 2–5: temuan, KF/KNF, use case, user story	[__]
Nita Lutfyah A.W	Technical Writer	Pembuatan PPT	[__]
Chandra Budianto	Programmer	SRS bag. 6-8: Kebutuhan data, Kebutuhan antarmuka eksternal, Prioritas dan rencana rilis	[__]
Fatikah Puspa Indah	Software Tester	SRS bag. 9-10: Matriks keterlacakan kebutuhan, dan Referensi pernyataan penggunaan AI	[__]

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.
13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

[tanggal W-01] · [tatap muka / daring / WhatsApp]
Hadir: Firstanova Setiani (klien), [nama anggota tim]

Yang dibahas

Data KOL dikelola di spreadsheet; pencocokan dengan brief brand brief brand lambat karena profil dicek satu per satu; brand butuh butuh detail kandidat (SRS bag. 2.3).

Masukan dan keputusan klien

SRS v1.0 menunggu review dan persetujuan klien (Lampiran B belum ditandatangani), dibutuhkan sebelum desain dimulai di Minggu 7.

Perubahan kebutuhan

Tidak ada: ruang lingkup F-01 sampai F-09 sama dengan RD.
RD.
Dampak: SRS, Gantt, dan biaya tidak berubah · Persetujuan SRS: belum

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-03	Data KOL dari klien tidak lengkap atau tidak akurat	Tinggi	Validasi isian (KNF-08); impor satu kali dari spreadsheet sebelum UAT	SA
R-01, R-02	Domain dan hosting (PHP, MySQL) belum disepakati dan dibayar klien	Sedang	Bahas biaya (± Rp500.000/tahun) dan batas Minggu 12 saat review SRS	PM
R-08	Penanggung jawab pemeliharaan belum ditetapkan	Sedang	Minta klien menetapkan penanggung jawab sebelum BAST	PM
baru	Lampiran A dan persetujuan SRS belum lengkap	Tinggi	Lengkapi notulen dan kuesioner; jadwalkan tanda tangan klien sebelum Minggu 7	SA

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

Tidak ada saat ini; masukan atas SRS v1.0 dipersilakan sebelum diajukan ke klien.

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
[4.x]	Lengkapi Lampiran A (notulen, studi dokumen wawancara)	TW	Mg 7
[4.x]	Tanda tangan klien (Lampiran B)	SA	Mg 7
5.1	Rancang ERD (5 entitas utama)	Programmer	Mg 7
5.2	Wireframe dan prototipe di Figma	Desain	Mg 7–8

JATUH TEMPO

Dokumen SDD

Minggu 6 · [2 November 2026]

Pertemuan klien: [30 Oktober 2026], untuk persetujuan SRS
