PE N GE LO LA A N PRO YE K SIST E M I NFO RMA SI

Laporan Progres Minggu ke-6

Fase 3 · Analisis Kebutuhan (SRS)

Kelompok · Kelas
Kelompok 6 · 4KA22

Proyek · Klien
KOL Management Website
PT. Siapamau Infinite Growth

Pelapor · Tanggal
Satria Ananda (SA) [01/11/2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

30%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

30%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: SDD pada M7-M8

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
2.1	Identifikasi penggunaan (KOL, Admin/Tim Brand)	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag . 1.1 d an 1 .2
2.2	Observasi alur kerja founder dan admin	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag . 2.1 , 2.2 , d an 2.3
2.3	Perancangan Use case dan user story	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag . 4.1 , g am bar 3.1 dan 4 .1
2 .4	Analisis Kebutuhan Fungsional	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag . 4.2 , 4.3 , d an 4.4
2 .5	Analisis Kebutuhan non Fungsional	Satria Ananda	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag . 5
	Persetujuan kebutuhan oleh klien	Seluruh anggota kelompok	Mg 6	✓ Selesai	SRS bag persetujuan kebutuhan oleh klien

Selesai 6 dari 6 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- SRS KOL Management Website v1.0 – draf – [tautan vclass] vclass]
- Diagram konteks dan use case (Gbr. 3.1, 4.1)
- 15 KF · 8 KNF · 8 use case · 12 user story
- Matriks keterlacakan kebutuhan (bag. 9)
- Persetujuan kebutuhan oleh klien : SRS bag persetujuan kebutuhan oleh klien (Lampiran B)

Bukti: nomor bagian dan gambar pada SRS. Lampiran A (notulen, kuesioner) kuesioner) dan Lampiran B (persetujuan klien) masih dilengkapi.

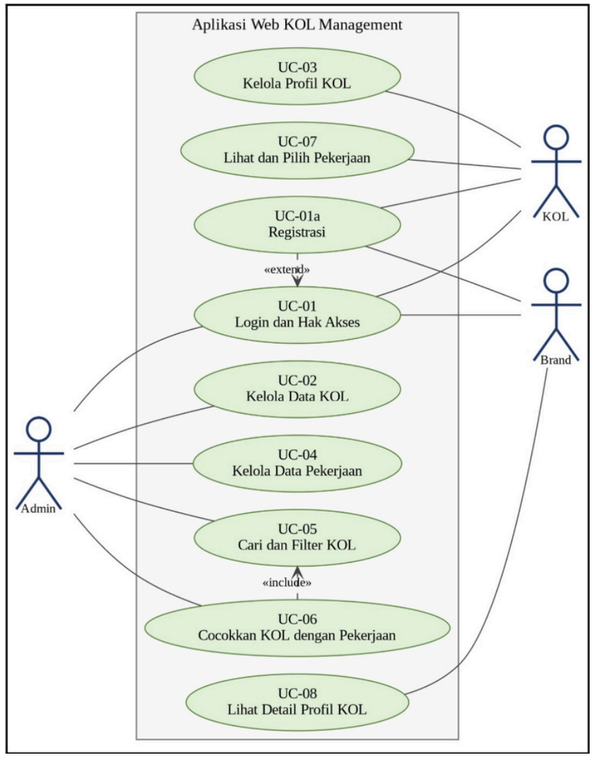

Gambar 4.1 Diagram Use Case (SRS bag. 4.2)

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Melvin Diandra S .A	Project Manager	Melakukan koordinasi penyusunan dokumen SRS v1.0 dan riwayat revisi, serta menyusun dokumentasi persetujuan kebutuhan sistem bersama klien.	2
Satria Ananda H.S	System Analyst	Menambahkan dan menjelaskan relasi <<include>> pada tabel User Story dan tabel Use Case, serta melengkapi lampiran yang diperlukan dalam dokumen SRS.	5
Nita Lutfyah. A. W	Technical Writer	Pembuatan PPT & Menyusun notulen dialog wawancara dan pertanyaan saat pertemuan dengan klien.	3
Chandra Budianto	Programmer	Memperbarui KF 1 dan UC 1 dengan menambahkan fitur registrasi pengguna.	2
Fatikah Puspa Indah	Software Tester	Memperbarui diagram Use Case dengan menambahkan relasi <<extend>> pada proses registrasi.	2

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13. 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

30 Oktober 2026, Menteng, Jakarta.

Hadir: Firstanova Setiani (klien), Chandra Budianto(Programmer), Fatikah Puspa Indah (Tester), Melvin Diandra (PM, Desain), Nita Lutfyah (Technical Writer)

Yang dibahas

Pembahasan kembali kebutuhan klien, meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, serta user story yang tercantum dalam dokumen SRS, dilanjutkan dengan proses konfirmasi dan persetujuan dokumen SRS oleh klien.

Masukan dan keputusan klien

SRS v1.0 telah dibahas bersama klien dan seluruh kebutuhan sistem yang tercantum di dalamnya telah disetujui tanpa adanya revisi kebutuhan. Selanjutnya, tim akan melanjutkan ke tahap perancangan desain sistem untuk kemudian ditinjau oleh klien.

Perubahan kebutuhan

Tidak ada: ruang lingkup F-01 sampai F-09 sama dengan RD. RD.

Dampak: SRS, Gantt, dan biaya tidak berubah · Persetujuan SRS: belum

Kendala dan risiko

ID	Kend ala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R- 03	Data KOL dari klien belum lengkap atau masih terdapat data yang kurang akurat.	Tinggi	Melakukan validasi kelengkapan dan keakuratan isian formulir KNF-08 serta menyiapkan proses impor data dari spreadsheet sebelum UAT.	SA
R- 01 , R- 02	Domain dan hosting (PHP, MySQL) belum disepakati dan dibayarkan oleh klien.	Sedang	Membahas estimasi biaya domain dan hosting (± Rp500.000/tahun) serta batas waktu keputusan bersama klien saat review SRS.	PM
R- 08	Penanggung jawab pemeliharaan sistem belum ditetapkan.	Sedang	Meminta konfirmasi klien terkait penetapan penanggung jawab pemeliharaan sistem sebelum pelaksanaan BAST.	PM
baru	Lampiran A dan dokumen persetujuan SRS belum lengkap. (Sudah diselesaikan dan dilengkapi.)	Tinggi	Menyusun notulen pertemuan berupa daftar pertanyaan kepada klien terkait kesesuaian dan persetujuan kebutuhan sistem yang tercantum dalam dokumen SRS.	TW

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

Tidak ada saat ini; masukan atas SRS v1.0 dipersilakan sebelum diajukan ke klien.

Rencana minggu depan


Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.1	Melakukan perancangan awal sistem berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui klien.	SD	Mg 7
4.2	Pembuatan wireframe dan desain antarmuka.	SD	Mg 7
4.3	Penentuan konsep visual sistem.	Seluruh anggota kelompok	Mg 7
4.4	Review hasil desain bersama klien.	Seluruh anggota kelompok	Mg 7 –8

JATUH TEMPO

Dokumen SDD

Minggu 7-8 · [11-18 November 2026]

Dokumentasi Penandatanganan SRS

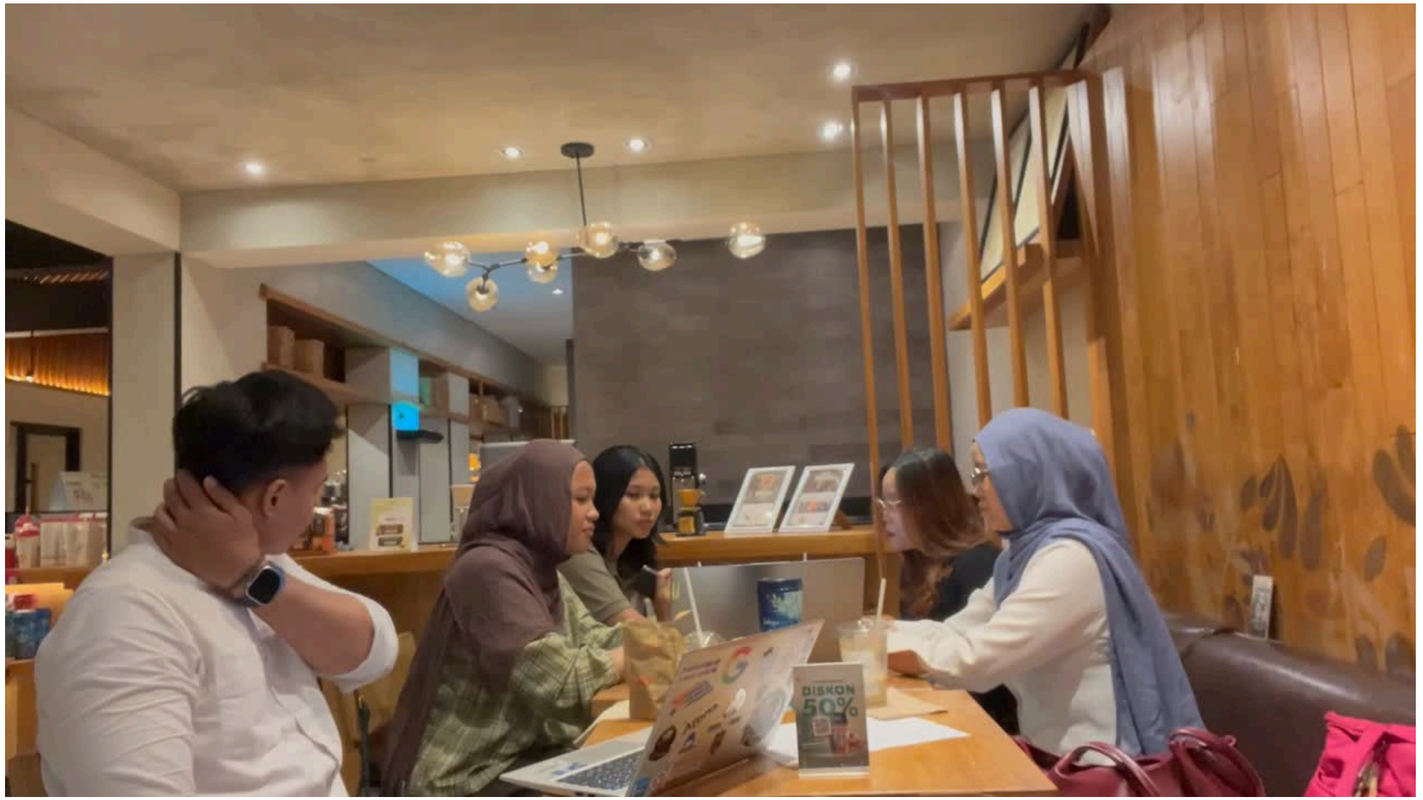



Dokumentasi Satria saat Lomba

