PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-7

Fase 4 · Perancangan Sistem · Software Design Document (SDD)

Kelompok · Kelas

Kelompok 6 · 4KA22
Chandra Budianto (10123269)
Melvin Diandra (10123662)
Nita Lutfyah A.W (1123002)
Satria Ananda H.S (1123231)
Fatikah Puspa (10122481)

Proyek · Klien

KOL Management Website
PT. Siapamau Infinite Growth

Pelapor · Tanggal

Melvin Diandra (SD) [09/11/2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

50%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

40%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6	Mg 7–8 · kini	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone minggu ini: SDD v1.0 dikumpulkan pada M8 (7 November 2026)
Milestone berikutnya: Sprint 1 pemrograman pada M9

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
4.1	Perancangan awal sistem berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui klien	Melvin Diandra	Mg 7	✓ Selesai	SDD bag. 2–5: keputusan desain, arsitektur, proses bisnis
4.2	Pembuatan wireframe dan desain antarmuka	Melvin Diandra	Mg 7	✓ Selesai	SDD bag. 6: 16 layar dan prototipe Figma
4.3	Penentuan konsep visual sistem	Seluruh anggota	Mg 7	✓ Selesai	SDD bag. 6.4: prinsip antarmuka; kode warna final di style guide Figma
4.4	Review hasil desain bersama klien	Seluruh anggota	Mg 7–8	Belum	Lampiran persetujuan rancangan oleh klien belum diisi
—	Penyusunan dokumen SDD v1.0	Seluruh anggota	Mg 8	Revisi	Draf v1.0 terkumpul; bag. 4.2, 5, 7–9, 12 masih dilengkapi

Selesai 3 dari 5 tugas

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)


Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti


SDD KOL Management Website v1.0 – draf – [tautan vclass]

- Arsitektur tiga lapisan, 13 komponen, dan sequence diagram UC-01/UC-01a
- 8 keputusan desain (D-01 s.d. D-08) dan desain keamanan
- Proses bisnis usulan dan struktur navigasi tiga peran
- 16 layar (L-01 s.d. L-16), aturan validasi, dan prinsip antarmuka
- Peta sprint 1–3 dan matriks keterlacakan KF-01 s.d. KF-15

Bukti: nomor bagian dan gambar pada SDD. Bag. 4.2, 5, 7, 8, 9, 12 dan lampiran persetujuan klien masih dilengkapi.

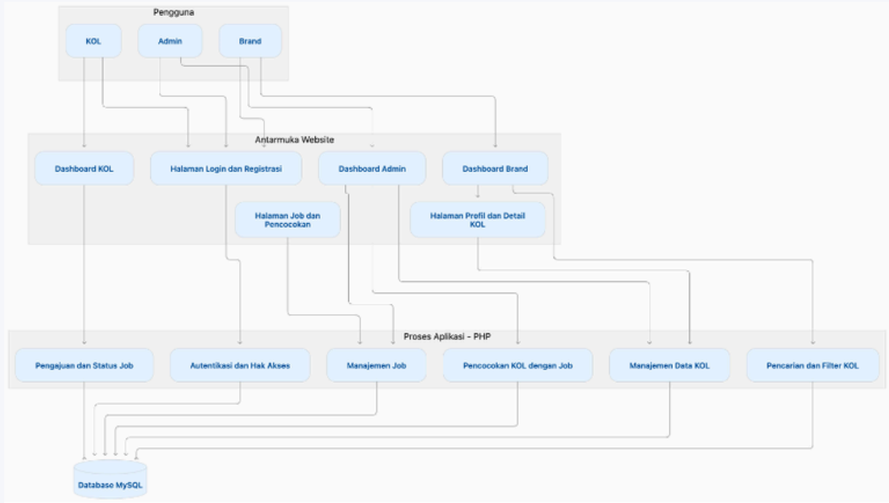

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem (SDD bag. 3.1)

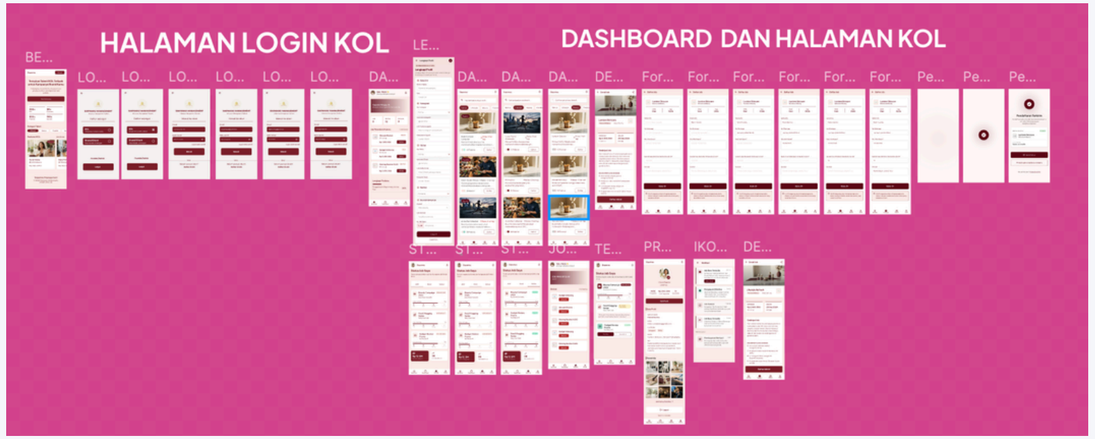

Prototipe Figma: Login dan Dashboard KOL (SDD bag. 6.3)

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Melvin Diandra S.A	Project Manager dan Desain	Perancangan awal, wireframe dan desain antarmuka (4.1, 4.2); penyusun SDD	**8**
Satria Ananda H.S	System Analyst	Penyusun SDD; menjaga keterlacakan KF/UC ke desain	**8**
Nita Lutfyah A.W	Technical Writer	Penyusun SDD; pembuatan PPT progres dan penyususnan SDD bag 1 dan 2	**8**
Chandra Budianto	Programmer	Menyiapkan server uji XAMPP untuk Sprint 1	**8**
Fatikah Puspa Indah	Software Tester	Penyusun SDD; Bag 10 dan 11	**8**

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment kedua yang diisi di vclass pada Minggu 8.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

[isi tanggal dan tempat]
Hadir: Firstanova Setiani (klien) dan anggota kelompok yang hadir [isi].

Yang dibahas

Review rancangan SDD: proses bisnis, struktur navigasi, dan rancangan layar (mockup Figma) sebelum dijadikan dasar pemrograman.

Masukan dan keputusan klien

[isi masukan klien atas rancangan]
Persetujuan dicatat pada lampiran SDD (Persetujuan Rancangan oleh Klien).

Perubahan rancangan

Perubahan setelah persetujuan dicatat pada Riwayat Revisi SDD. Lingkup tetap UC-01 s.d. UC-08 dan UC-01a; Won't Have tidak berubah.

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-03	Data KOL dari klien belum lengkap atau kurang akurat	Tinggi	Validasi formulir KNF-08 dan siapkan impor data dari spreadsheet sebelum UAT	SA
R-01, R-02	Domain dan hosting (PHP, MySQL) belum disepakati dan dibayarkan klien	Sedang	Bahas estimasi biaya (± Rp500.000/tahun) dan batas keputusan; server produksi memakai hosting klien	PM
R-07	Data KOL diakses pihak tidak berwenang	Tinggi	Diatasi di desain: hak akses tiga peran, hash kata sandi, validasi input (SDD bag. 3.5)	SD
R-08	Penanggung jawab pemeliharaan sistem belum ditetapkan	Sedang	Minta konfirmasi klien sebelum BAST	PM
baru	Bagian SDD 4.2, 5, 7–9, 12 dan persetujuan klien belum lengkap	Tinggi	Lengkapi sebelum Sprint 1 (Mg 9); persetujuan rancangan oleh klien	TW

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

Tidak ada saat ini; masukan atas SDD v1.0 dipersilakan sebelum presentasi di kelas.

Rencana minggu depan

Kode	Tugas	PIC	Target
4.4	Review dan persetujuan rancangan oleh klien; lengkapi lampiran persetujuan SDD	Seluruh anggota	Mg 8
4.5	Lengkapi SDD: activity diagram, ERD, skema relasional, kamus data, desain modul	SA, SD, TW	Mg 8
5.1	Siapkan lingkungan pemrograman (XAMPP, GitHub branch main dan dev)	Chandra (Programmer)	Mg 8–9
5.2	Sprint 1: UC-01, UC-01a, UC-02; layar L-01 s.d. L-05; tabel Pengguna dan KOL	Programmer, tim	Mg 9

JATUH TEMPO


Dokumen SDD

Minggu 8 · [07/11/2026]


Presentasi SDD di depan kelas dan peer assessment kedua di vclass (Minggu 8)

Kode WBS 4.5 dan 5.x disesuaikan dengan WBS di Gantt Chart.


Dokumentasi rancangan

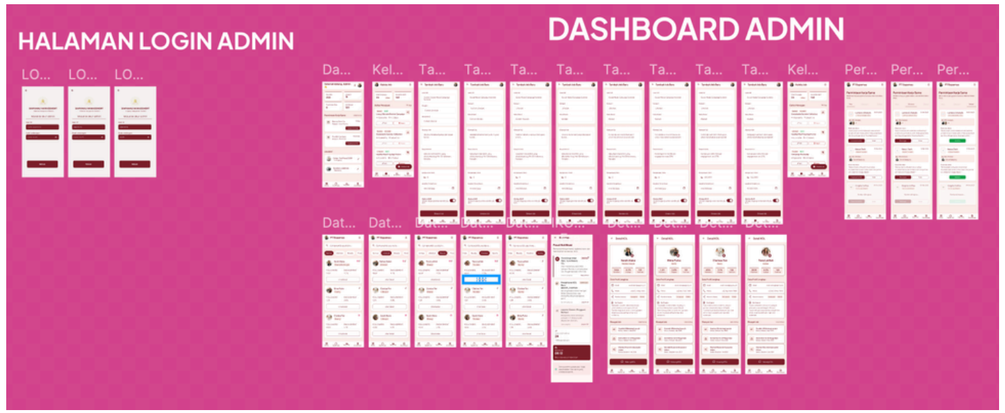


Prototipe Figma Admin

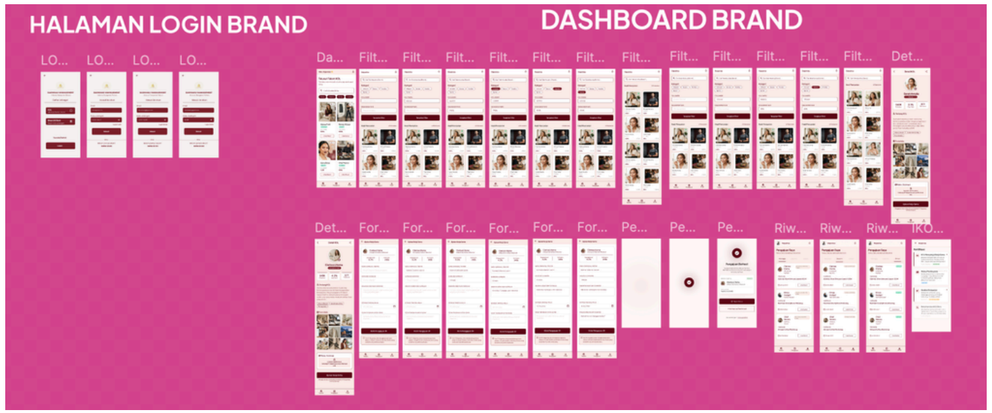

Prototipe Figma Brand

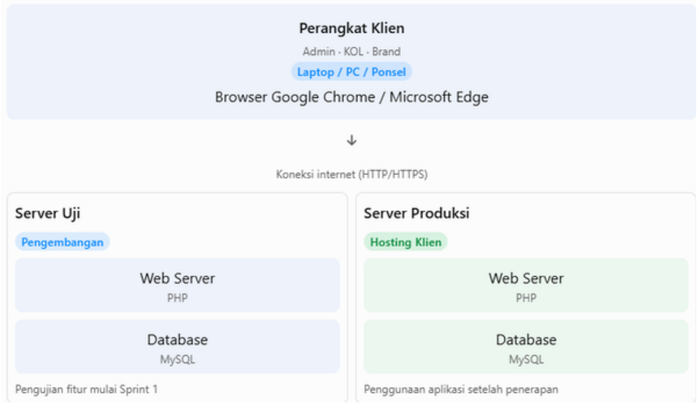

Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan

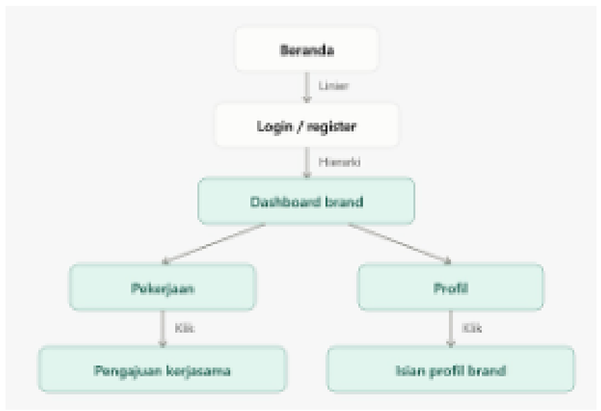

Struktur navigasi (SDD bag. 6.1)
